



planet  
campus

COMITE NATIONAL #5

26 mai 2021



wifirst

# Ordre du jour

**1. Avancement du projet PlanetCampus**


**2. Optimisation de l'exploitation**




## **Avancement du projet PlanetCampus**

## Les chiffres clés

### Mars 2021

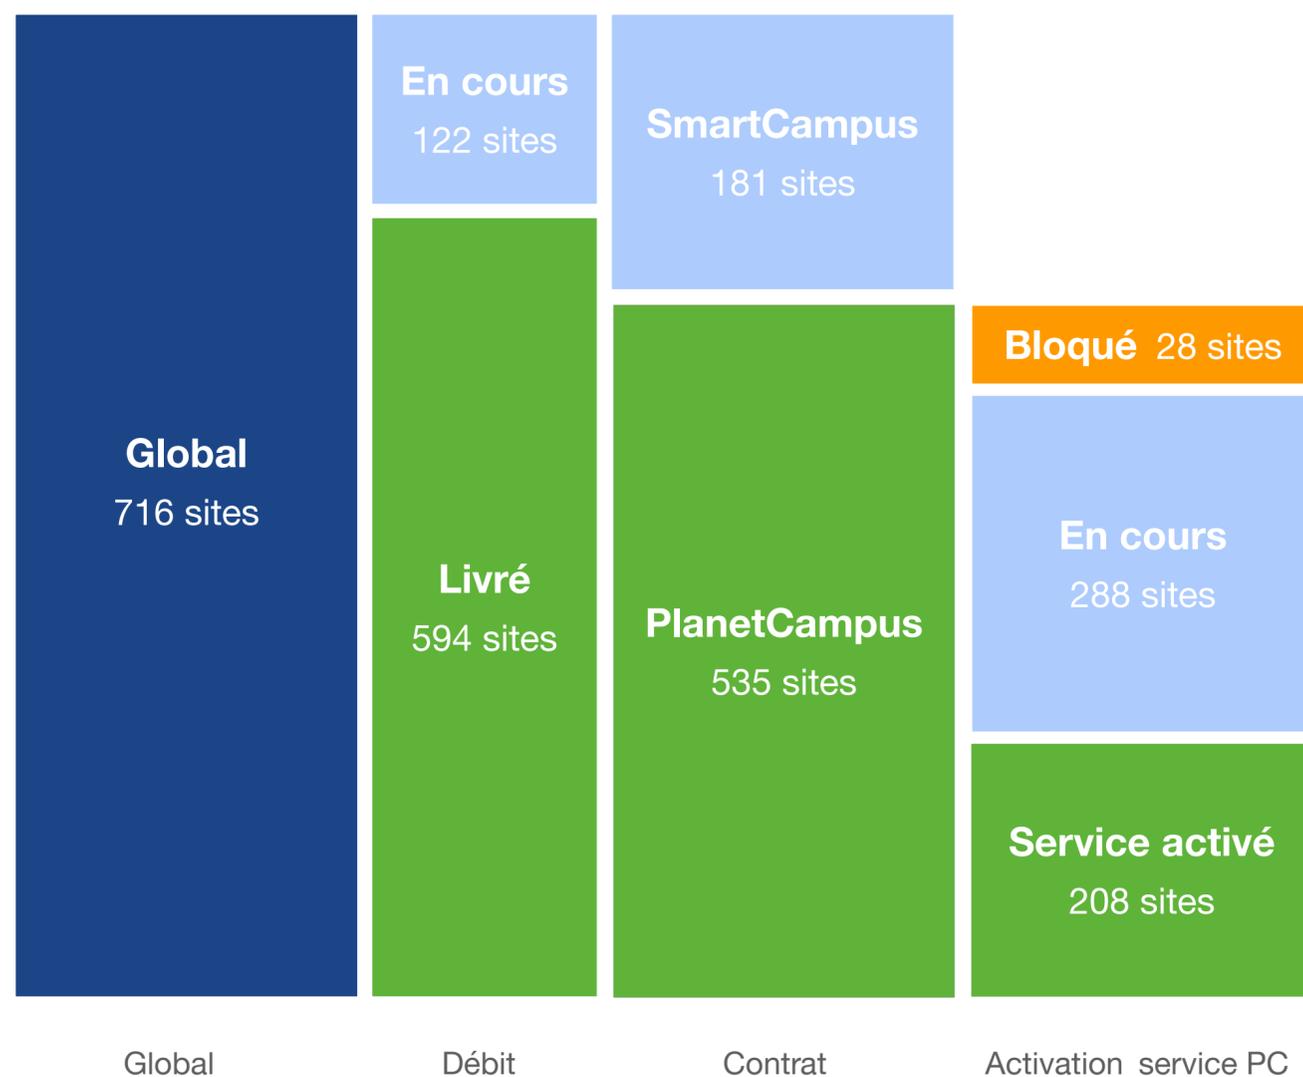

### Mai 2021

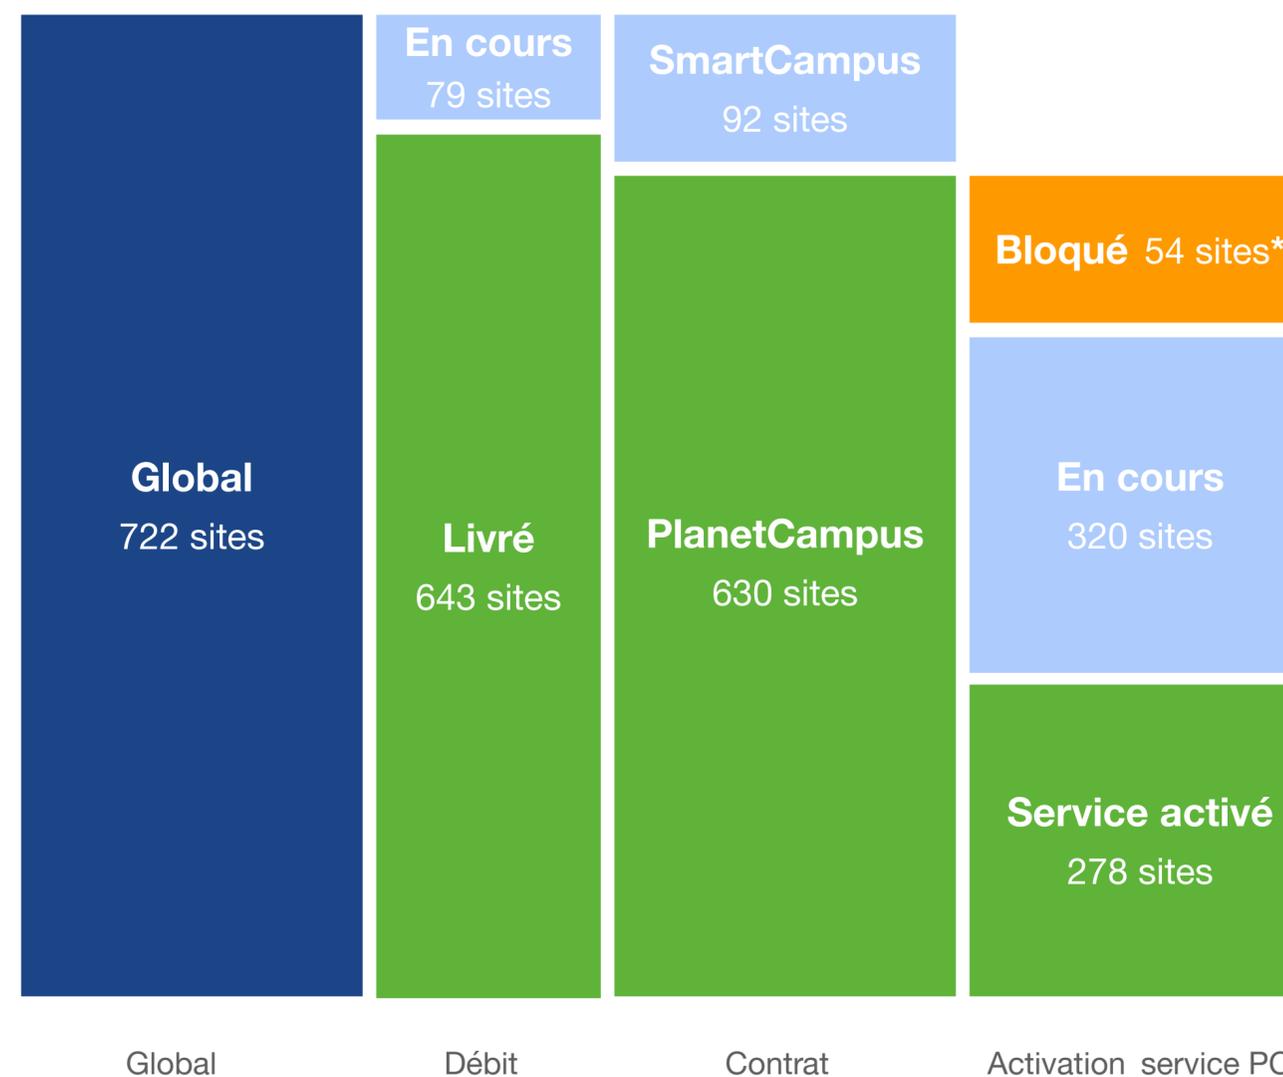

\* 22 non encore sollicités par Wifirst, BdC réceptionnés le 21/05

## 1. Projet PlanetCampus : état d'avancement

# 13% du parc non contractualisé sur PlanetCampus

### Mars 2021 : 75%

CROUS	PLANETCAMPUS	SMARTCAMPUS	TOTAL	%
AIX-MARSEILLE	8	24	32	25%
AMIENS	13		13	100%
BORDEAUX	54	11	65	83%
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	1	38	39	3%
CLERMONT	21		21	100%
CRETEIL	26		26	100%
GRENOBLE	31	6	37	84%
LILLE	42		42	100%
LIMOGES	10		10	100%
LORRAINE	1		1	100%
LYON	33	10	43	77%
MONTPELLIER	41		41	100%
NANTES	40		40	100%
NICE	12	4	16	75%
NORMANDIE	3	32	35	9%
ORLEANS TOURS	36	1	37	97%
PARIS	43	40	83	52%
POITIERS	5		5	100%
REIMS	12	4	16	75%
RENNES	28		28	100%
STRASBOURG	14		14	100%
TOULOUSE	36		36	100%
VERSAILLES	25	11	36	69%
<b>TOTAL</b>	<b>535</b>	<b>181</b>	<b>716</b>	<b>75%</b>

### Mai 2021 : 87%

CROUS	PLANETCAMPUS	SMARTCAMPUS	TOTAL	%
AIX-MARSEILLE	32		32	100%
AMIENS	15		15	100%
BORDEAUX	55	10	65	85%
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	1	38	39	3%
CLERMONT	21		21	100%
CRETEIL	26		26	100%
GRENOBLE	31	6	37	84%
LILLE	42		42	100%
LIMOGES	10		10	100%
LORRAINE	1		1	100%
LYON	44		44	100%
MONTPELLIER	41		41	100%
NANTES	43		43	100%
NICE	12	4	16	75%
NORMANDIE	3	32	35	9%
ORLEANS TOURS	36	1	37	97%
PARIS	82	1	83	99%
POITIERS	5		5	100%
REIMS	16		16	100%
RENNES	28		28	100%
STRASBOURG	14		14	100%
TOULOUSE	36		36	100%
VERSAILLES	36		36	100%
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>92</b>	<b>722</b>	<b>87%</b>

Objectif : finalisation de la phase de contractualisation  
mi-juin 2021

## 1. Projet PlanetCampus : état d'avancement

# 91% des sites en exploitation au débit cible

### Mars 2021 : 83%

CROUS	LIVRÉ	EN COURS	TOTAL	%
AIX-MARSEILLE	26	5	31	84%
AMIENS	11	3	14	79%
BORDEAUX	64	3	67	96%
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	16	23	39	41%
CLERMONT	18	2	20	90%
CRETEIL	25	2	27	93%
GRENOBLE	35	2	37	95%
LILLE	35	7	42	83%
LIMOGES	8	0	8	100%
LORRAINE	0	1	1	0%
LYON	42	4	46	91%
MONTPELLIER	25	16	41	61%
NANTES	29	11	40	73%
NICE	15	1	16	94%
NORMANDIE	31	5	36	86%
ORLEANS TOURS	30	7	37	81%
PARIS	73	10	83	88%
POITIERS	5	0	5	100%
REIMS	16	0	16	100%
RENNES	26	2	28	93%
STRASBOURG	14	0	14	100%
TOULOUSE	16	19	35	46%
VERSAILLES	34	2	36	94%
<b>TOTAL</b>	<b>594</b>	<b>125</b>	<b>719</b>	<b>83%</b>

### Mai 2021 : 91%

CROUS	LIVRÉ	EN COURS	TOTAL	%
AIX-MARSEILLE	29	3	32	91%
AMIENS	12	3	15	80%
BORDEAUX	65	0	65	100%
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	19	20	39	49%
CLERMONT	18	3	21	86%
CRETEIL	25	1	26	96%
GRENOBLE	36	1	37	97%
LILLE	42	0	42	100%
LIMOGES	8	2	10	80%
LORRAINE	0	1	1	0%
LYON	43	1	44	98%
MONTPELLIER	39	2	41	95%
NANTES	29	14	43	67%
NICE	16	0	16	100%
NORMANDIE	31	4	35	89%
ORLEANS TOURS	30	7	37	81%
PARIS	78	5	83	94%
POITIERS	5	0	5	100%
REIMS	16	0	16	100%
RENNES	27	1	28	96%
STRASBOURG	14	0	14	100%
TOULOUSE	27	9	36	75%
VERSAILLES	34	2	36	94%
<b>TOTAL</b>	<b>643</b>	<b>79</b>	<b>722</b>	<b>91%</b>

Objectif : **finalisation livraison débit cible**  
à la rentrée 2021

## 1. Projet PlanetCampus : état d'avancement

# Volume important de redéploiements en cours

CROUS	Contrat Smartcampus	Nombre de résidences	Statut			
			#0 Plans en attentes	#1 Audit en cours	#2 Chantier en cours	#3 Chantier livré
AIX-MARSEILLE	0	31	3	15	12	2
AMIENS	0	10		3		7
BORDEAUX	10	54	1	4	4	45
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	38	1				1
CLERMONT	0	20		7	1	12
CRETEIL	0	26		12	2	12
GRENOBLE	6	31	4	5	6	16
LILLE	0	36		15	6	17
LIMOGES	0	8		3		5
LORRAINE	0	1		1		-
LYON	0	41	5	5		31
MONTPELLIER	0	41	4	8	5	24
NANTES	0	39		10	9	20
NICE	4	12		6	4	2
NORMANDIE	32	3		1		2
ORLEANS TOURS	1	36		2		34
PARIS	1	79	30	18		31
POITIERS	0	5		1		4
REIMS	0	16	1	3		12
RENNES-BRETAGNE	0	28		4	3	21
STRASBOURG	0	14			1	13
TOULOUSE	0	17		1		16
VERSAILLES	0	36	6	8	2	20
<b>GLOBAL</b>	<b>92</b>	<b>585</b>	<b>54</b>	<b>132</b>	<b>55</b>	<b>347</b>


**54** plans en attente de réception

**132** audits en cours

**347** chantiers finalisés

## 1. Projet PlanetCampus : état d'avancement

# Trajectoire impactée par le contexte sanitaire

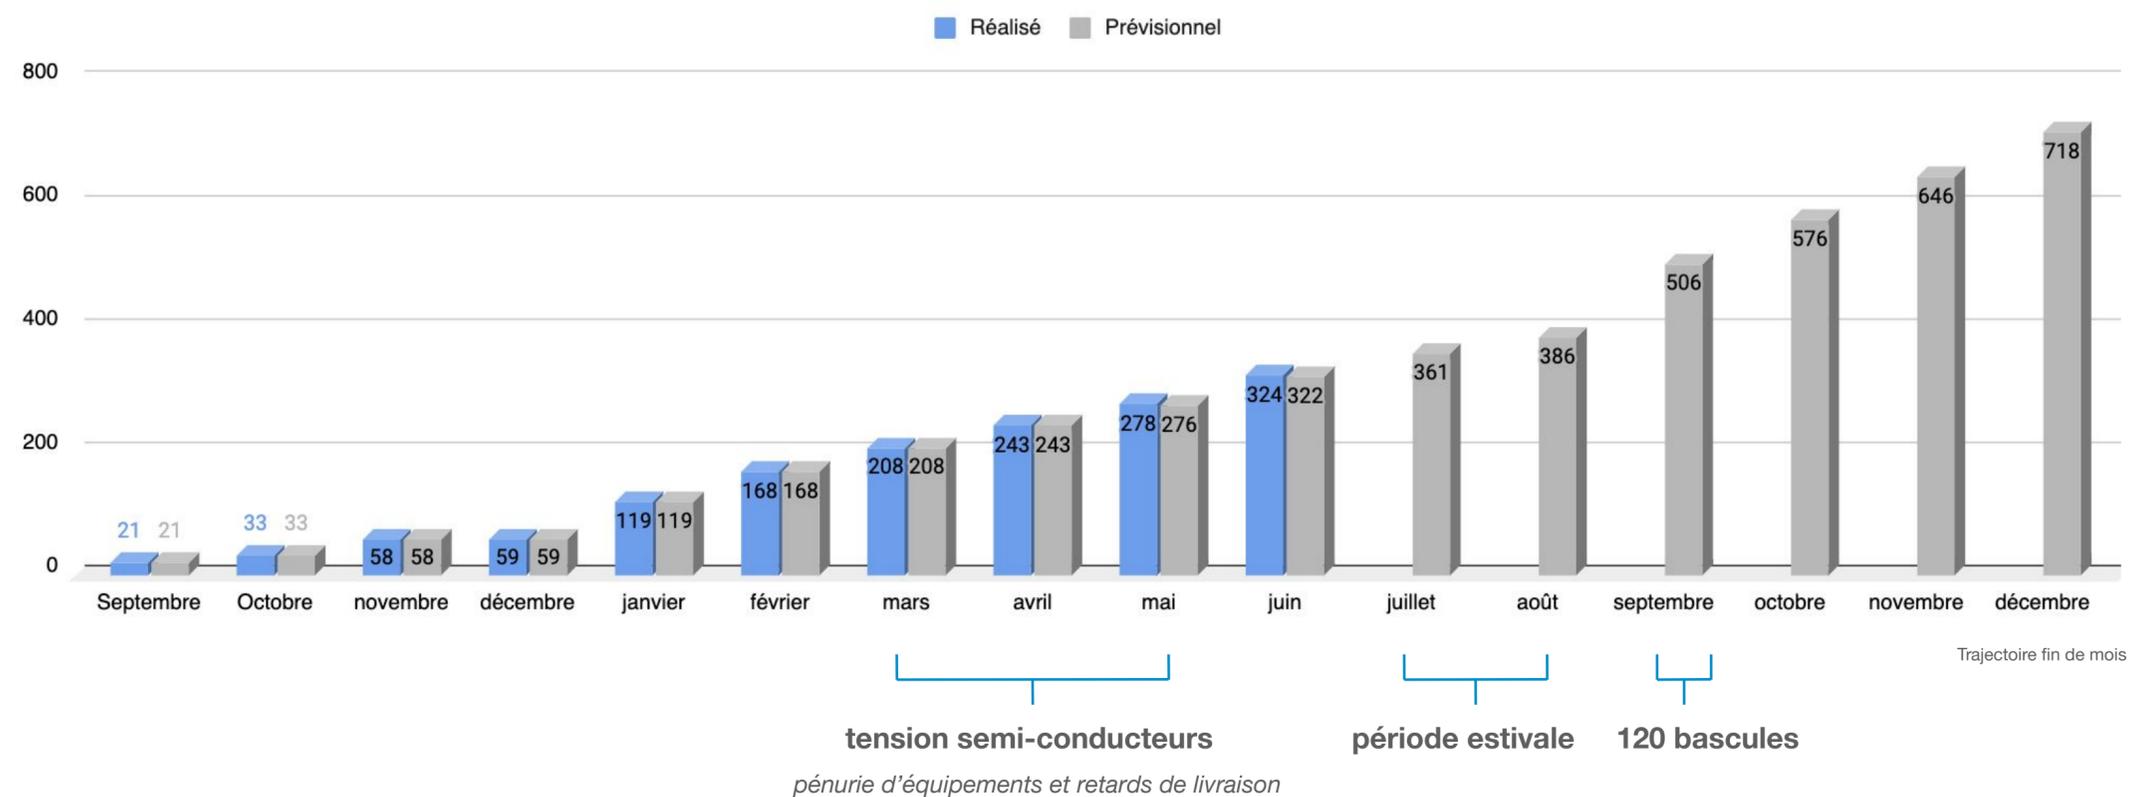

## Facteurs clés de succès

- Augmentation des ressources Wifirst mobilisées
- Période estivale :
  - Accès aux résidences
  - back-up décideurs CROUS
- Réception des BdC PlanetCampus restants  
→ *objectif mi-juin 2021*

**Objectif : finalisation des activations des services PC fin 2021**



# 2

## Optimisation de l'exploitation

## Chantiers d'optimisation du pilotage à trois niveaux

	Finalisé	Prochaines étapes
<b>Reporting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi mensuel régulier la première semaine du mois</li> <li>• Ajout des données service (SmartCampus, PlanetCampus)</li> <li>• Amélioration du format / visuel (national)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure granularité de l'indicateur <i>Disponibilité du service</i> (T2 2021)</li> <li>• Nouvelles métriques analytiques en construction (T4 2021)</li> </ul>
<b>Organisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% des contacts mis à jour</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en pilage de comités des pilotage régionaux (T4 2021)</li> <li>• Intégration du ROC dans la grille d'escalade (T2 2021)</li> </ul>
<b>MyCenter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webinaire de formation réalisé le 09/04/2021</li> <li>• Atelier #1 (DSI / Wifirst) réalisé le 26/04/2021 pour recueillir les retours d'expérience et les besoins d'évolution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atelier #2 pour présenter la roadmap de développement myCenter (T3 2021)</li> <li>• Chantier de regroupement des sites / réunification des bâtiments (T4 2021)</li> </ul>



Anwar **REGIS-LYDI**  
ROC



Antoine **RAMON**  
Product Owner


## Analyse de l'utilisation du service WiFi privé (RAN)

**50 K** utilisateurs de PlanetCampus sur **278** sites

**11 K** utilisateurs du RAN sur **191** sites

### Taux d'activation du RAN en progression

% sur volume d'utilisateurs

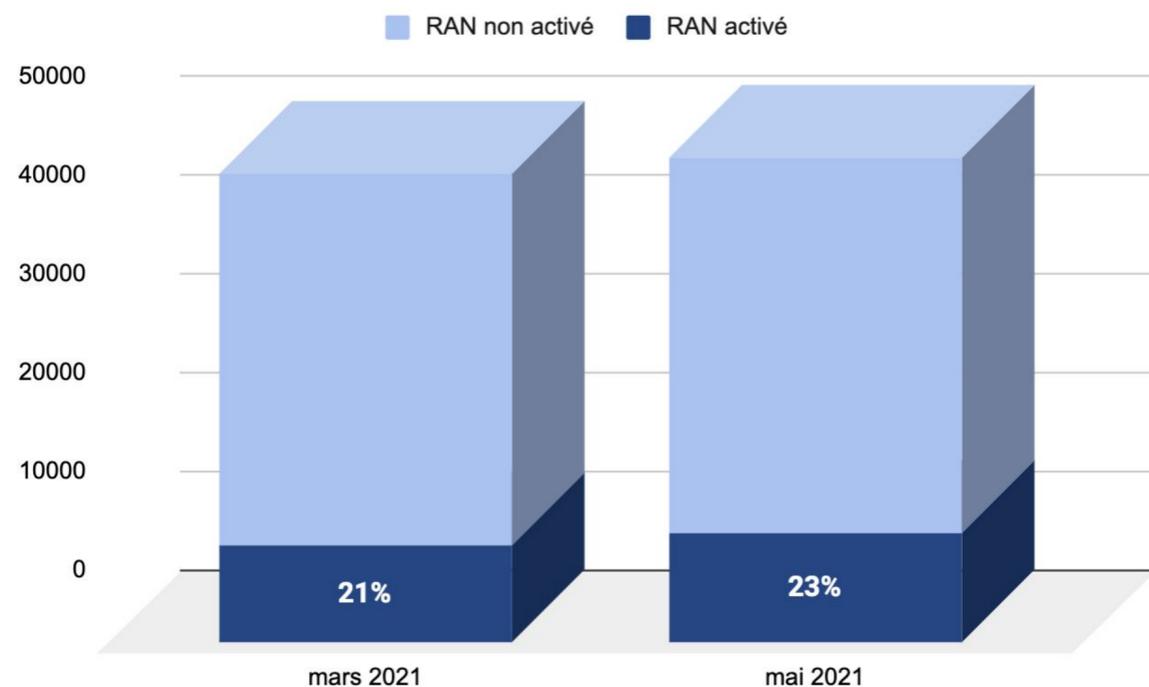


### Top 5 résidences :

Taux d'activation RAN

1. **Delouard** (Amiens) : **54%**
2. **Maison des Scientifiques** (Bordeaux) : **53%**
3. **At'Ome** (Toulouse) : **52%**
4. **Magnanerie** (Grenoble) : **50%**
5. **Mail des Mèches** (Créteil) : **45%**

### 1/4 des appareils connectés via le WiFi privé

Appareils connectés au réseau PlanetCampus le 23/05/2021 à 18h30

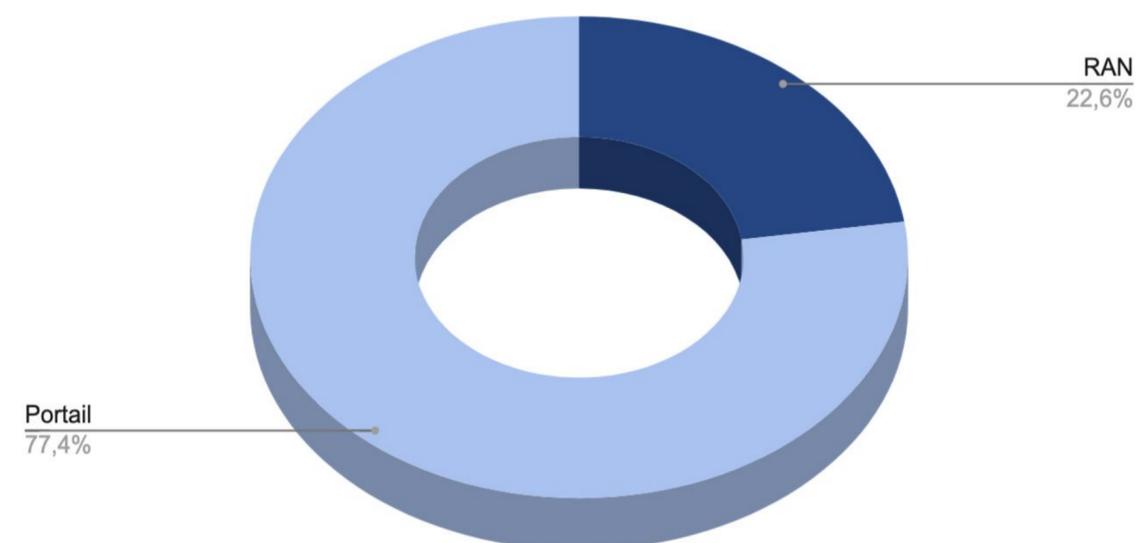

 wifirst // [www.wifirst.com](http://www.wifirst.com)
